
WIEDERAUFBAU der „KIRCHENBURG WALLDORF“ **nach dem Brand am 3.04.2012, 16.35 Uhr / Einzeldenkmal**

Bauherr: Gemeindegemeinderat der Kirchengemeinde Walldorf, Pfarrgasse 7, 98639 Walldorf

Chronologie der Ereignisse, Planungs- & Bauablauf:

Einsatzbericht der Feuerwehr:

Alarmierung der Feuerwehr: am 03.04.2012 um 16:37 Uhr

Zunächst blieb der Brand in der historischen Kirche unbemerkt bis Anwohner den Qualm entdeckten, diese informierten die Rettungsleitstelle Schmalkalden-Meiningen und versuchten die Flammen mit Handfeuerlöschern zu bekämpfen.

Innerhalb kürzester Zeit entwickelte es sich zu einem Vollbrand.

Nach einer umfassenden Lageerkundung wurden, durch den Einsatzleiter, kurze Zeit später weitere Feuerwehren zur Brandbekämpfung nachgefordert.

Die Feuerwehr war auch noch die gesamte Nacht mit der Drehleiter und einem Tanklöschfahrzeug vor Ort, um Brandwache zu halten. Zur Brandwache gehörten die Gebäude regelmäßig zu begehen und zu kontrollieren, um eventuelle neu anführende Glutnester schnell zu finden und zu bekämpfen.

Zusammengefasste Zahlen

- 137 Einsatzkräfte, davon Feuerwehr 104, Polizei 16, DRK 17
- 6 Feuerwehren mit 21 Fahrzeugen
- 16 eingesetzte Atemschutztrupps

05.04. – 18.04.2012

- der Turmhelm und der geschädigte Dachstuhl des Kirchturmes werden demontiert
- Die vier Glocken des Geläuts werden demontiert und heruntergehoben
- Ein Notdach für den Kirchturm wird installiert.
- Die Polizei und Brandgutachter untersuchen die Brandstelle.

19.04.2012 / Freigabe der Brandortes durch die Polizei

24.04.2012 / 01. Planungsberatung & Begehung der Brandstelle Kirchenburg Walldorf

Brandschutz- Beräumung und Notsicherung der Kirche, Außengerüst mit Notdach / 05-2012 - 11-2012

Erarbeitung der Bestandsaufnahme, Schadensanalyse bestehender Bauteile, und deren bauhistorische + denkmalpflegerische Wertung und Einordnung der Fachplaner.

Im Einzelnen:

- | | |
|--|----------------------------------|
| ▪ Bestandsdokumentation / Schadensanalyse | Architekt K. Merkel |
| ▪ Bestandsdokumentation / Schadensanalyse Statik | Trabert+Partner / Herr Schuchert |
| ▪ Bestandsdokumentation / Schadensanalyse Werkstein – Natursteingefüge | ISD / Frau Dr. Kirsten |
| ▪ Bestandsdokumentation Putz / Farben / allgem. Fassungen | Frau B. Jünger |


WIEDERAUFBAU der „KIRCHENBURG WALLDORF“ nach dem Brand am 3.04.2012, 16.35 Uhr / Einzeldenkmal

Bauherr: Gemeindegemeinderat der Kirchengemeinde Walldorf, Pfarrgasse 7, 98639 Walldorf

05.06.2012 / 01. Baustellenberatung / Notsicherung

01,1) Strukturbildung der Baumaßnahme / Bezeichnung des Bauwerkes in Bauteile:

- Bauteil 1 - Hauptschiff, Chor, Sakristei
- Bauteil 2 - Kirchturm, Treppenturm

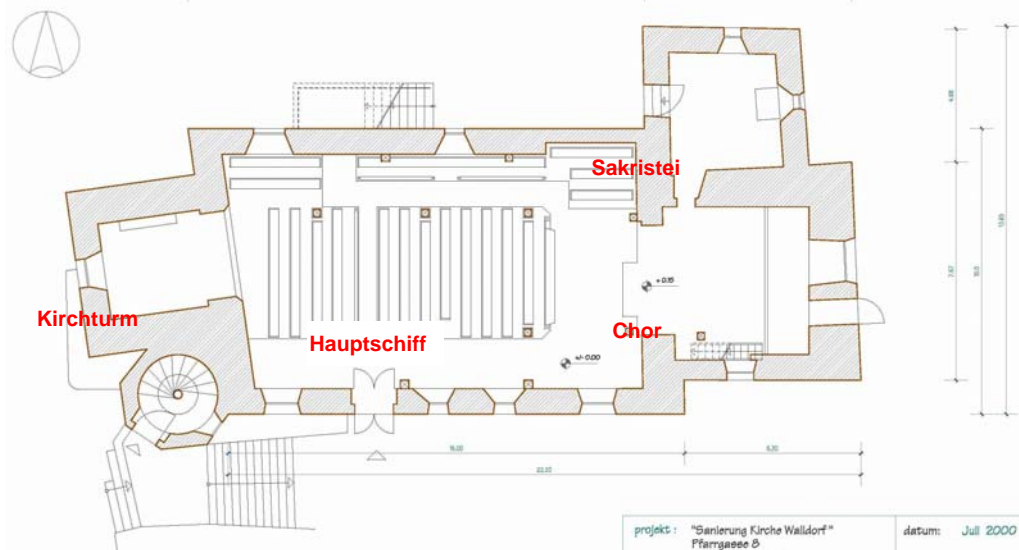

01,2) Zugangssicherung des Kircheninnenraumes

Auf Grund der augenscheinlichen Bauauffälligkeit der Holzkonstruktionen der Emporen im Hauptschiff (Südseite) wurde der Zugang von Süden gesperrt!! **EINSTURZGEFAHR!!!**
Der Zugang in die Kirche durch Sakristei ist bedingt möglich!

01,3) Vergabe Bauleistung Brandschutt-Beräumung an die Firma Vatro

01,3) Brandschutt-Beräumung / Ablaufschema

Vor Ort Information + generelle Einweisung ins Objekt zum Ablauf durch den Architekten.
Folgender Ablauf der Bauleistung wurde festgelegt:

Bauteil 1 / Hauptschiff, Chor

- ❖ Zeichnung, Dokumentation und Kartierung noch vorhandener Balkenkonstruktionen der Emporen im Hauptschiff und Chor
- ❖ Demontage und fachgerechte Lagerung auf Nordseite der Kirche
- ❖ Brandschutt- Beräumung unter ständiger Aufsicht Restaurator

Bauteil 2 / Kirchturm

- ❖ Gerüststellung für Zugang Kirchturm
- ❖ Zeichnung, Dokumentation und Kartierung noch vorhandener Balkenkonstruktionen
- ❖ Demontage und fachgerechte Lagerung auf Nordseite der Kirche
- ❖ Brandschutt-Beräumung unter ständiger Aufsicht Restaurator

Nach Abschluss der Beräumung Stellung Notdach Bauteil 1 und komplette Einrüstung Bauteil 2 / Kirchturm.

01,4) Terminkette Brandschutt-Beräumung :

Baustelleneinrichtung 11,06,2012 / Baubeginn ab 12,06,2012 / Baustellenbesetzung 5*AK + 1*Polier

WIEDERAUFBAU der „KIRCHENBURG WALLDORF“ **nach dem Brand am 3.04.2012, 16.35 Uhr / Einzeldenkmal**

Bauherr: Gemeindegkirchenrat der Kirchengemeinde Walldorf, Pfarrgasse 7, 98639 Walldorf

August 2012 / Stellung Außengerüst für die gesamte Kirche und Notdach für das Hauptschiff!

September 2012 / Beginn der umfangreichen archäologischen Grabungen in der Kirche!

02.10.2012 / 18. Baustellenberatung / Notsicherung beendet

27.02.2013 / 08. Planungsberatung / die Vergleichsverhandlung mit der Versicherung wurden beendet

25.10.2013 / Wettbewerb zur Innenraumgestaltung Kirche - Innenarchitektur

1. BAUABSCHNITT / Bauarbeiten die in 2013 - 2014 ausgeführt worden:

24.05.2013 / 01. Baustellenberatung / 1. BAUABSCHNITT

- ❖ Statisch Konstruktive Sicherung Turmschaft (Kirchturm Treppenturm)
- ❖ Werksteinrestaurierung + Mauerwerkssanierung Turmschaft (Kirchturm Treppenturm)
- ❖ Außenfassade von Kirchturm / Treppenturm:
- ❖ Dachstuhl + Dachdeckung Kirchturm + Treppenturm:

20.09.2013 / der Dachstuhl des Kirchturmes wird aufgesetzt

11.10.2013 / Kirchturm / die Turmhaube wird aufgesetzt

14.10.2013 / Richtfest Kirchturm / Kirchturmzier wird aufgesetzt

08.11.2013 / Schwingungsmessung im Kirchturm

10.11.2013 / die neue Dachdeckung des Kirchturm ist fertig!

22.04.2014 / 37. Baustellenberatung / 1. BAUABSCHNITT

2. +3. BAUABSCHNITT / Bauarbeiten die in 2014 - 2015 -2016 – 2017 ausgeführt worden:

29.04.2014 / 38. Baustellenberatung / 1.+2. BAUABSCHNITT

- ❖ Statisch Konstruktive Sicherung Mauerwerk Hauptschiff, Chor, Sakristei
- ❖ Werksteinrestaurierung + Mauerwerkssanierung Hauptschiff, Chor, Sakristei
- ❖ Außenfassade von Hauptschiff, Chor, Sakristei:
- ❖ Dachstuhl Hauptschiff, Chor, Sakristei:

01.-03.2014 / die das Gewölbe der Gruft Nr. 1 wird neu erstellt

03.-04.2014 / die Kirchgaden Ostseite werden repariert!

06.05.2014 / der Turmdrehkran wird gestellt

WIEDERAUFBAU der „KIRCHENBURG WALLDORF“ **nach dem Brand am 3.04.2012, 16.35 Uhr / Einzeldenkmal**

Bauherr: Gemeindegemeinderat der Kirchengemeinde Walldorf, Pfarrgasse 7, 98639 Walldorf

20.06.2014 / Kamera-Befahrung Gruft Nr.3

29.08.2014 / die neuen Glocken werden in Karlsruhe gegossen
29.08.2014 / die neuen Glocken kommen nach Walldorf

September – Oktober 2016 / der neue Dachstuhl für Hauptschiff, Chor und Sakristei wird gestellt

10.10.2014 / die neuen Glocken werden in den Kirchturm gebracht /
die Zifferblätter der Kirchturmuhre werden montiert /
das Richtfest Hauptdach

21.10.2014 / der neue Glockenstuhl wird aufgebaut

18.11.2014 / die neue Dachdeckung des Kirchendaches ist fertig!

25.11.2014 / die neuen Glocken werden im neuen Glockenstuhl installiert
das Glockengeläut und die Kirchturmuhre werden in Betrieb genommen.

03.02.2015 / das neue Storchennest auf dem Ost-Turm wird aufgestellt
17.03.2015 / der erste Storch ist auf dem Storchennest

05.2015 / Aufbau Pavillon des verkohlten Holzes auf dem Nordturm

05.-07.2015 / Wiederaufbau großer Leitergaden auf der Nordseite

06.-09.2015 / Nord-, Süd- und Westturm

09.-10.2015 / 5 Stck. Erdwärmebohrungen 120 m tief werden gebohrt

18.07.2015 / Wettbewerb Orgelbau

15.09.2015 / 103. Baustellenberatung / 1.+2. BAUABSCHNITT

22.09.2015 / 104. Baustellenberatung / 2. + 3. BAUABSCHNITT

12.04.2016 / Wettbewerb zur Glasgestaltung der Kirchenfenster

02.-06.2016 / Einbau Grund-, ELT, Heizung- Leitungen im Außenbereich der Kirche

03.-09.2016 / Neuprofilierung Gelände und Gestaltung im Außenbereich der Kirche

02.-12.2016 / Sanierung Wehrmauer der Kirchenburg in einzelnen Abschnitten

04.-06.2016 / Sanierung von zwei Kellern unter der Kirchenburg

27-06-2016 / der erste Jungstorch „Karsten“ auf der Kirchenburg wird beringt.

06.-08.2016 / Einbau FB-Heizung + Stampflehmfußboden in der Kirche

WIEDERAUFBAU der „**KIRCHENBURG WALLDORF**“ nach dem **Brand am 3.04.2012, 16.35 Uhr** / Einzeldenkmal

Bauherr: Gemeindegemeinderat der Kirchengemeinde Walldorf, Pfarrgasse 7, 98639 Walldorf

06.-08.2016 / Ausbau + Einbau Technikgebäude im „Gartenhaus“

05.-12.2016 / umfangreiche Sanierung der Fachwerkkonstruktion Gemeindehaus

07.-12.2016 / an der westlichen Außenmauer wird eine Kletterwand installiert

20.12.2016 / 160. Baustellenberatung / 2. + 3. BAUABSCHNITT

24.12.2016 / erstes Grippenspiel der Kirchengemeinde Walldorf
